政府信息公开

名　　称：	商河县郑路高商高速公路建设项目“8·16”一般物体打…
索 引 号：	113701260043244911P/2023-6509061
发文单位：	县应急管理局
发布日期：	2023-10-20

商河县郑路高商高速公路建设项目“8·16”一般物体打击事故调查报告

字号： 大 中 小 打印整页 打印内容 分享

商河县郑路高商高速公路建设项目“8·16”一般物体打击事故调查报告

编制单位：商河县政府事故调查组

编制日期：2023年10月13日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事发工程概况.....2
（二）参建单位情况.....2
（三）工程发包、承包及分包情况.....3
（四）事故现场情况.....4
二、事故发生经过、应急处置、评估情况、警示教育及四位一体工作开展情况.....5
（一）事故发生经过.....5
（二）事故应急处置和评估情况.....6
（三）事故信息接报情况.....6
（四）现场警示教育会情况.....6
（五）“四位一体”工作开展情况.....7
三、事故发生原因分析.....7
（一）直接原因分析.....7
（二）间接原因分析.....7
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....8
（一）因在事故中死亡（受伤）免予追究责任人员.....8
（二）对有关公职人员的处理建议.....8
（三）对事故有关责任人员的处理建议.....8
（四）对事故有关责任单位的处理建议.....10
五、事故主要教训.....11
六、事故整改和防范措施.....11

商河郑路高商高速公路建设项目
“8·16”

一般物体打击事故调查报告

2023年8月16日19时30分许，高青至商河公路第三合同段K32＋110梁板架设过程中发生一起物体打击事故，造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失约270万元。

事故发生后，县委县政府高度重视，主要领导同志相继作出批示，要求加强督导调度，尽快查明原因，按照相关要求抓好落实，严防类似事故发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，8月18日，县政府成立了由县委常委、副县长任组长，县应急局、县总工会、县公安局、县公路事业发展中心、郑路镇政府有关人员组成的商河高商高速公路建设项目“8·16”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），邀请县检察院参加，对事故开展调查。同时，向县纪委监委通报事故情况，并邀请其参加事故调查组有关会议并监督。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展调查工作。通过现场勘查、调查取证、询问相关人员和综合分析等工作，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

经调查认定，该事故是一起因违章组织作业导致的一般生产安全责任事故，且存在迟报行为。

一、事故基本情况

（一）事发工程概况

事发工程位于高青至商河公路第三合同段K32+110中桥，桥梁全长48m，桥跨组合为3×16m，基础采用钻孔灌注桩基础，下部结构采用台柱式墩，上部结构采用16m装配式预应力混凝土矮T梁。

（二）参建单位情况

1.山东高速高商公路有限公司，项目建设单位。成立于2022年6月8日，统一社会信用代码：91370126MABQAR****，公司注册地址：山东省济南市商河县城区产业园新兴街以南规划西环路以东，法定代表人：刘**，经营类型：有限责任公司(国有控股)，经营范围：公路管理与养护，房地产开发与经营，建设工程施工等。

2.中建八局第一建设有限公司，项目施工单位。成立于1984年06月22日，单位地址为济南市工业南路89号，统一社会信用代码：91370000163048****，法定代表人：董**，经营类型：有限责任公司，建筑业企业资质证书编号：D137002667，建筑工程施工总承包特级资质，市政公用工程施工总承包特级资质，机场场道工程专业承包贰级资质，安全生产许可证编号：（鲁）JZ安

许证字〔2006〕180605-04，经营范围：建筑业企业资质范围内的房屋建筑、公路、铁路、港口与航道、水利水电、电力、石油化工、市政公用、通信、机电工程的咨询、设计、施工、总承包、专业承包工程和项目管理等。

3.山东一诺源路桥有限公司，项目专业分包单位。成立于2012年1月17日，统一社会信用代码：91370283587827****，安全生产许可证编号（鲁）JZ安许证字〔2022〕026337，特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级，证书编号：D237573005，公司注册地址：青岛平度市田庄镇财源路42号，法定代表人：王**，经营类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：建筑工程施工，施工专业作业，公路管理与养护，预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产，土石方工程施工等。

4.山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司，项目监理单位。成立于1993年4月2日，统一社会信用代码：91371600746582****，公司注册地址：山东省滨州市经济开发区黄河五路259号，法定代表人：孙**，经营类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：在全国范围内承担一、二、三类公路工程、桥梁工程和二、三类交通工程施工监理、咨询、实验检

测等。公司成立了高青至商河公路第三合同段驻地办，配备了监理班子。

（三）工程发包、承包及分包情况

2022年6月30日，建设单位与施工单位签订《高青至商河公路施工合同协议书》（第三合同段）。2022年9月30日，建设单位与监理单位签订了高青至商河公路施工监理合同协议书。


2023年4月17日，施工单位与专业分包单位签订了《建设工程施工专业分包合同》，将高青至商河公路施工三标段梁板架设工程专业分包给了山东一诺源路桥有限公司。同时签订《建设工程分包安全管理协议》，明确了甲乙双方的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，约定由违反国家有关规定及协议规定的责任方对事故负责。

（四）事故现场情况

事发位置位于高青至商河公路项目第三合同段K32＋110处，山东一诺源路桥有限公司专业分包的梁板架设作业现场。事故发生前几日商河县普降中到大雨，事故发生当日施工场地有多处水坑，作业处地面承载能力不符合梁板架设施工要求。事故致因物为桥梁梁板边梁，梁板规格长16米，高0.9米，呈T字型，上端宽约1.2米，一侧预制环筋高约0.5米，下端宽约0.35米，总

重量约23吨。梁板与地面之间使用枕木进行了支垫，梁板两端使用圆木进行了支撑固定。

图1：事故现场示意图

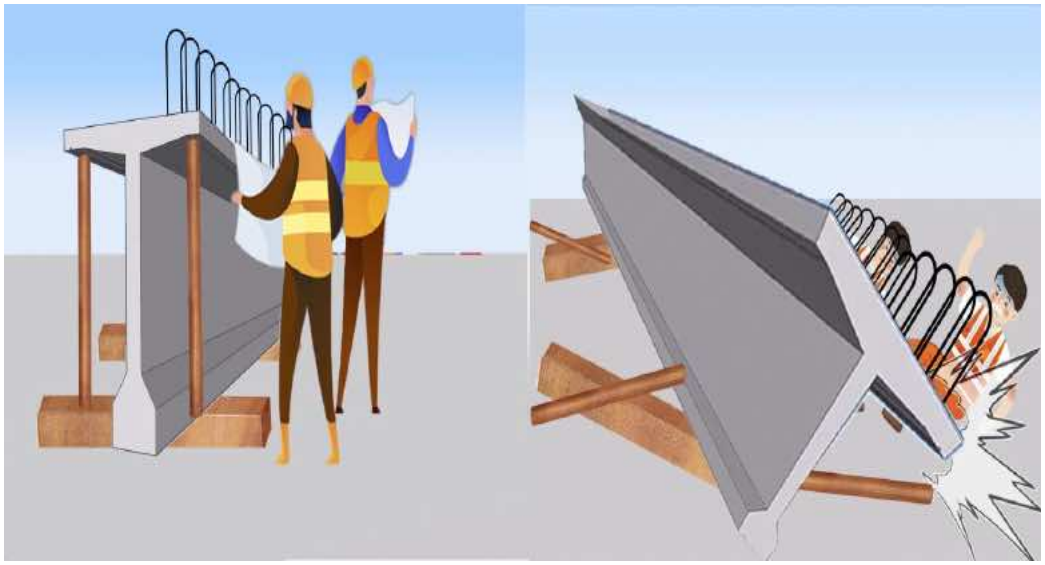

二、事故发生经过、应急处置、评估情况、警示教育及四位一体工作开展情况

（一）事故发生经过

2023年8月16日，山东一诺源路桥有限公司按施工计划对项目K32＋110处开展梁板架设工作，当天上午中建八局第一建设有限公司项目部安排施工现场负责人查看了施工现场，发现现场有多处水坑，认为不符合施工条件，要求山东一诺源路桥有限公司施工负责人王*云待现场条件好点再开展施工作业。当天下午，王*云未向项目部提交作业审批表即安排工人开始对K32＋110处开展梁板架设工作。17时许，山东一诺源路桥有限公司驾驶员杨*滨和张*强驾驶车辆将3片梁板运送至施工现场后，开始架设梁板。19时许，将第1、2片梁板架设完

成后，王*云见天色渐黑，于是安排工人将第3片梁板卸至地面并使用圆木进行了固定支撑，待第二天再架设。19时30分，王*云和张*强查看梁板固定情况时，梁板忽然倾倒将王*云和张*强砸中。

（二）事故应急处置和评估情况

事故发生后，现场人员立即组织吊车将梁板挪开，并拨打了120急救电话。19时50分左右，救护车到达现场后将张*强和王*云紧急送往医院救治，王*云因受挤压经抢救无效死亡，张*强腿部受伤，经医院治疗正在康复中。接到报告后，县应急局、县公路事业发展中心立即组织人员赶往现场了解相关情况，积极做好善后赔偿安抚，开展先期调查及取证工作，家属情绪稳定，社会舆情平稳。

（三）事故信息接报情况

19时40分杨*滨将事故发生情况向王*升进行了汇报，王*升接到报告后，立即安排人员抢救并赶赴医院，对家属进行安抚工作，未在1小时内向负有安全生产监督管理部门报告，造成迟报。8月17日22时左右，王*升将事故情况向施工单位项目部经理董*华进行了汇报，17日22时25分，董*华向县应急局和县公路事业发展中心上报了事故情况，县应急局接到事故报告后，立即向市应急局进行报告。

（四）现场警示教育会情况

根据《山东省生产安全事故现场警示教育办法（试行）》要求，2023年8月24日，县安委会办公室在事故现场组织召开了事故警示教育会议，县应急局、县公路事业发展中心及有关企业负责人、安全管理人员共40余人参加。

（五）“四位一体”工作开展情况

根据《关于“四位一体”加强事故调查处理工作的通知》（鲁安办发〔2022〕5号）要求，事故调查组对涉案企业单位、监管部门等相关人员在干部作风、廉政建设、涉黑涉恶等方面进行了调查，未发现相关问题。在安全生产方面，相关企业在落实安全生产主体责任、规章制度和操作规程、隐患排查治理方面存在履职不到位的情况。

三、事故发生原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是：山东一诺源路桥有限公司施工负责人王*云未履行作业审批手续，在地面承载能力不稳定情况下违章组织施工作业，检查梁板稳固情况时安全意识淡薄，风险辨识不到位，梁板倾倒将王*云和张*强砸中，导致事故发生。

（二）间接原因分析

1.中建八局第一建设有限公司对分包单位现场安全生产工作统一协调、管理不力，督促落实安全生产规章制度执行不严。

2.山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司对施工现场的安全生产状况监理不到位。

3.县公路事业发展中心对所属行业领域生产经营单位的安全生产工作监督检查不到位。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

王*云，男，群众，生前为山东一诺源路桥有限公司项目现场施工队长。未履行作业审批手续，违章组织施工作业，导致事故发生，对事故的发生负有直接责任，鉴于王*云已在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）对有关公职人员的处理建议

张*，男，党员，县公路事业发展中心安全科副科长，对本行业领域建设项目安全生产监督检查工作不到位，建议由县公路事业发展中心给予通报处理，并报县安委会办公室备案。

（三）对事故有关责任人员的处理建议

1.王*升，男，群众，山东一诺源路桥有限公司法定代表人。未认真履行安全生产管理职责，对本公司的安全生产工作监督检查不到位，且事故发生后未在法定时限内及时上报事故情况，造成迟报。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项、第（七）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项、第一百一十条第二款，结合《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》第137

项第1档、143项第2档的规定，分别裁量、合并处罚，建议由县应急局对其作出罚款（上一年收入百分之一百）****元的行政处罚。

2.石*宾，男，群众，山东一诺源路桥有限公司项目经理。未认真履行安全生产管理职责，对本项目的安全生产状况检查不到位，未能发现、制止和纠正违章指挥、违反操作规程的行为，对事故的发生负有管理责任。建议由山东一诺源路桥有限公司按照公司管理规定进行处理，并将处理结果书面报县安委会办公室备案。

3.宋*钢，男，群众，山东一诺源路桥有限公司安全员。未认真履行安全生产管理职责，未及时制止和纠正违反操作规程的行为，对事故的发生负有责任，建议由山东一诺源路桥有限公司按照公司管理规定进行处理，并将处理结果书面报县安委会办公室备案。

4.李*，男，群众，中建八局第一建设有限公司高青至商河公路第三合同段安全总监，未能发现、制止和纠正违章指挥、违反操作规程的行为，建议由中建八局第一建设有限公司按照公司管理规定进行处理，并将处理结果书面报县安委会办公室备案。

5.张*松，男，党员，山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司驻地工程师，对山东一诺源路桥有限公司所承包工程的安全生产监督检查不到位，未能发现、制止和纠正违章指挥、违反操作规程的行为，建议由山东

省滨州市公路工程监理咨询有限公司按照公司管理规定进行处理，并将处理结果书面报县安委会办公室备案。

（四）对事故有关责任单位的处理建议

1.山东一诺源路桥有限公司作为工程专业分包单位，未履行作业审批手续，违章组织施工作业，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款的相关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项，结合《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》第140项第3档的规定，建议由县应急局对其作出罚款**万元的行政处罚。

2.中建八局第一建设有限公司对专业分包单位的安全生产工作统一协调、管理不力，对事故的发生负有管理责任。建议由县公路事业发展中心对高青至商河公路第三合同段项目部进行约谈，并将约谈会议纪要报县安委会办公室备案。

3.山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司作为工程监理方，对施工现场的安全生产状况监理不到位，对事故的发生负有监理责任。建议由县公路事业发展中心对高青至商河公路第三合同段驻地办进行约谈，并将约谈会议纪要报县安委会办公室备案。

五、事故主要教训

此起事故暴露出企业安全生产主体责任落实不到位，风险辨识和隐患排查治理及安全生产规章制度和操

作规程落实不严格，事故发生后未按照法律法规及时上报等问题。

六、事故整改和防范措施

（一）山东一诺源路桥有限公司要严格落实安全生产主体责任，切实加强本单位的安全生产管理工作，加强风险辨识管控措施，增强法律法规意识。进一步加强施工现场安全生产管理，按照《建设工程分包安全管理协议》，严格落实安全生产规章制度和操作规程，坚决杜绝“三违”行为，确保施工安全。

（二）中建八局第一建设有限公司要加强对分包单位的统一协调管理，强化安全教育培训和安全技术交底，加大施工现场安全检查巡查力度，从严查处施工现场违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为，以及专业分包单位不服从安全管理的现象。

（三）山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司要按照法律法规、公路工程施工监理规范和工程监理合同规定，严格履行安全监理职责，加大对施工现场的检查力度，对发现的事故隐患或“三违”行为立即采取措施予以制止，督促各施工单位严格按照工程设计和规范、规程和标准要求施工。

（四）商河县公路事业发展中心要深刻吸取事故教训，同时举一反三，加大公路工程施工安全检查频次和深度，依法严厉打击公路工程施工领域违法违规行为，狠抓参建各方安全生产主体责任落实，筑牢行业监管防

线，坚决守牢安全生产底线，防止各类安全事故发生，确保公路工程施工领域安全稳定。

商河郑路高

商高速公路建设项目

“8·16”一般物体打击事故调查组

2023年10月13日

扫码使用手机浏览本页内容

单位概况

县应急管理局

440
信息发布总数

2
点击量

我要留言

友情链接

省级政府网站 | 地方政府网站 | 市政府部门网站

区（县）政府网站 | 其他网站

网站信息

网站地图 网站帮助

关于我们 网站声明

联系我们

主办单位：商河县人民政府

承办单位：商河县人民政府办公室

政府网站找错 济南市互联网违法和不良信息举报平台 党政机关

鲁ICP备12024603号-1 鲁公网安备37012602000123 政府网站标识码：3701260013
